

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット2段式

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場

■before



■after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット2段式（4連：8台×1基）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

平面駐車場：4列×1区画 全収容台数：4台

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット2段式 計8台
- ・縁石敷設工、ピット埋戻+アスファルト舗装（密粒）工事
- ・平面化駐車場改修工事：4台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置）


立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：地上2段式

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場

■before

■after



【既設機械式駐車装置】

地上2段式（5連：9台×1基）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

新設メッシュフェンス据付工事

平面駐車場：5列×1区画

全収容台数：5台


【施工内容】

・機械式駐車装置解体撤去工事：地上2段式 計9台
・ピット埋戻+アスファルト舗装（開粒）工事
・平面化駐車場改修工事：5台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置）
・左側新設メッシュフェンス取付工事

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：地上2段油圧式

■before



☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場

■after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット2段油圧式（5連：9台×1基）
計9台収容

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：地上2段油圧式（5連：9台×1基） 計9台
- ・ピット埋戻+アスファルト舗装（開粒）工事、植栽部撤去（植栽・残土撤去・CO研り・路盤整正工）+アスファルト舗装（開粒）
- ・平面化駐車場改修工事：6台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置） ・排水柵高上げ+埋設配管設置

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

植栽部撤去+アスファルト舗装平面化駐車場改修工事
平面駐車場：6列×1区画 全収容台数：6台

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）


☆ 既設立駐機：地上3段式

■ before



☆ 立駐機CO基礎撤去+路盤整正・平面化（表層：アスファルト舗装）

■ after

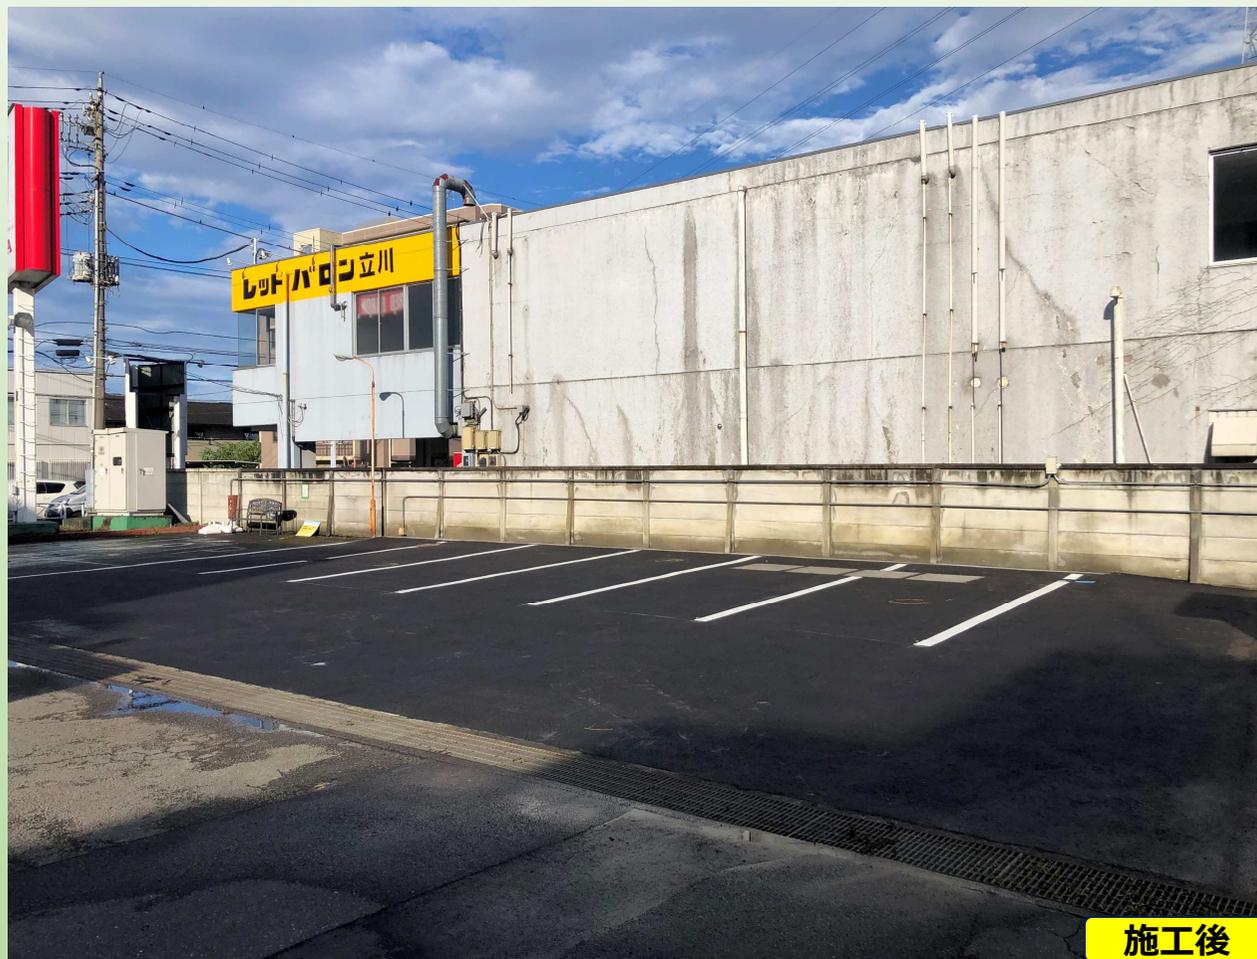

【既設機械式駐車装置】

単純3段式（6連：12台×1基） 計12台収容

【改修内容】☆ 機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

既設立駐機CO基礎解体撤去+アスファルト舗装平面化駐車場改修工事

平面駐車場：6列×1区画 全収容台数：6台

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：単純3段式（6連：12台×1基） 計12台・消火設備撤去+処分
- ・既設アスファルト撤去・既設立駐機CO基礎撤去・路盤整正工・油分離柵、散水栓高上げ・アスファルト舗装（密粒）
- ・平面化駐車場改修工事：6台（区画ライン引き）

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット3段式

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場

■before



■after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段式（2連：6台×1基・3連：9台×1基）
計15台収容

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

平面化駐車場：1台増設（CO研り+アスファルト舗装）
平面駐車場：6列×1区画 全収容台数：6台

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット3段式（2連：6台×1基・3連：9台×1基） 計15台
- ・ピット埋戻+アスファルト舗装（密粒）、縁石敷設工
- ・平面化駐車場増設：CO躯体研り+アスファルト舗装撤去・新設、安全フェンス撤去
- ・平面化駐車場改修工事：6台 区画ライン引き（溶着）、車室No.、車止め設置、電気工事+新設街路灯設置、消火設備撤去

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：地上2段・地上3段式

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）・全面張替え+平面化駐車場

■before



■after



【既設機械式駐車装置】

地上2段式（4連：7台×1基）
地上3段式（5連：13台×1基） 計20台収容

【施工内容】

・機械式駐車装置解体撤去工事：地上2段式・地上3段式 計20台
・ピット埋戻+アスファルト舗装（密粒）・新設パネルフェンス設置工事
・全面アスファルト舗装張替え工事+アスファルト舗装 平面化駐車場改修工事：6台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

全面アスファルト舗装張替え・新設外周パネルフェンス取付工事
新設駐輪場（屋根・駐輪機）設置工事（二段式：10台）
平面駐車場：3列×1区画・3列×1区画 全収容台数：6台

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット2段式

■before



☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場

■after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット2段式（4連：8台・6連：12台×各1基）計20台

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

平面駐車場：4列・6列×各1区画 全収容台数：10台

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット2段式（4連：8台×1基・6連：12台×1基）計20台
- ・縁石敷設工、ピット埋戻+アスファルト舗装（密粒）工事
- ・平面化駐車場改修工事：10台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置）
- ・付帯工事：既設メッシュフェンス撤去工事

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：地上4段式

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場

■before

■after



【既設機械式駐車装置】

地上4段式（7連：25台×1基） 計25台

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

平面駐車場：7列×1区画 全収容台数：7台

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：地上4段式（7連：25台×1基） 計25台
- ・排水樹高上げ、縁石敷設工、ピット埋戻+アスファルト舗装（密粒）工事
- ・平面化駐車場改修工事：7台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置）
- ・付帯工事：既設メッシュフェンス撤去工事、防犯カメラ移設工事

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット2段油圧式

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場



■before



施工前

■after



施工後

【既設機械式駐車装置】

昇降ピット2段油圧式（7連：14台×2基）計28台
（4連：8台×1基）計8台 計36台

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

平面駐車場：4列×1区画・7列×2区画
全収容台数：18台

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット2段油圧式（4連：8台×1基・7連：14台×2基） 計36台
- ・ピット埋戻+アスファルト舗装（密粒）工事、全面アスファルト舗装張替え工事
- ・平面化駐車場改修工事：18台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置）
- ・付帯工事：既設CO躯体研り工事（前面・中央躯体）

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット2段式・TT


☆ピット埋戻・TT埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場

■before

■after



施工前

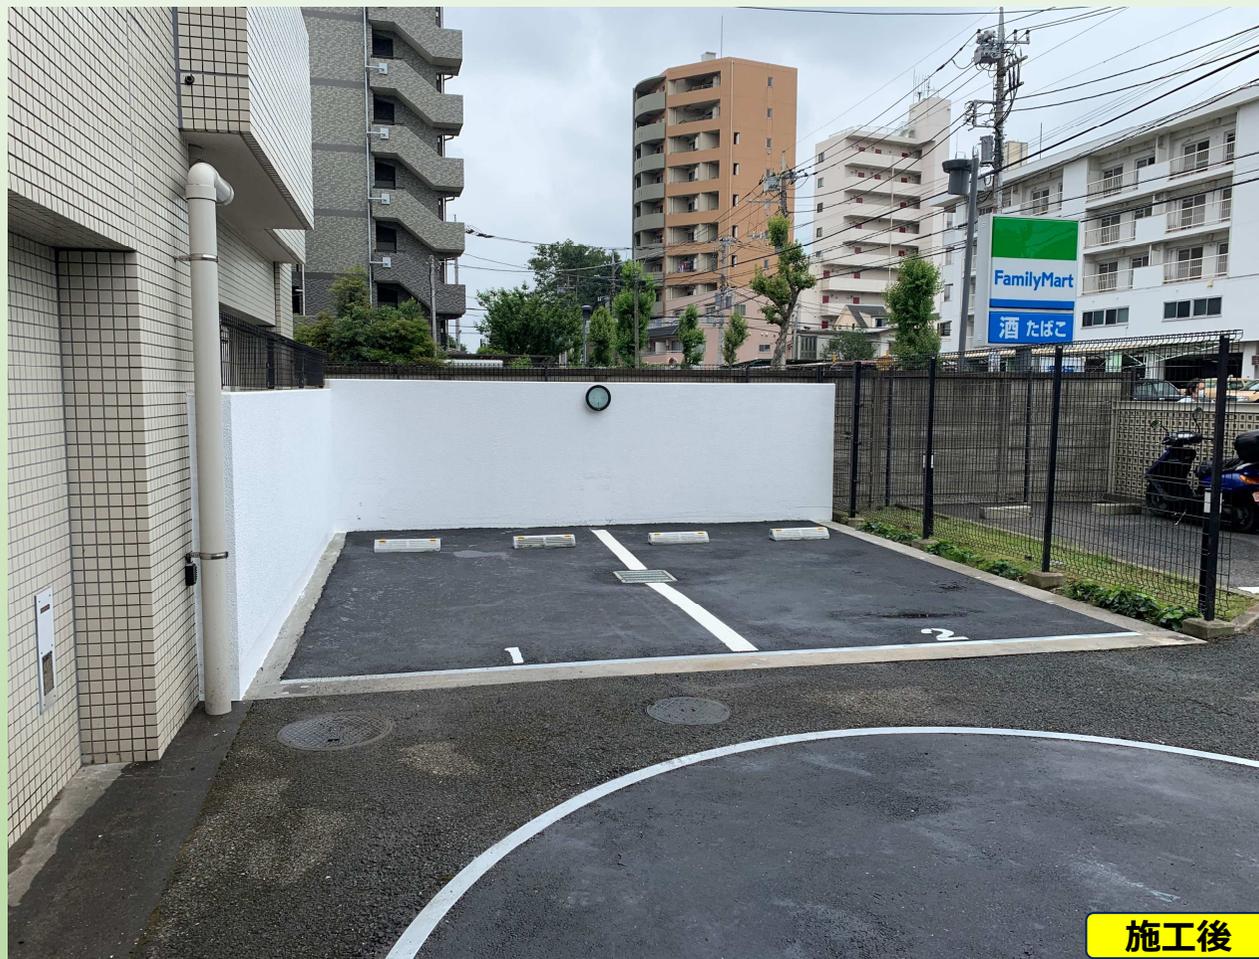

施工後

【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段式（2連：6台×1基）
ターンテーブル（Φ4000×1基） 計6台収容

【施工内容】・機械式駐車装置解体撤去工事：6台、ターンテーブル解体（1基）
・平面化駐車場改修工事：2台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

ターンテーブル解体・ピット埋戻アスファルト舗装改修工事
立駐前面浸透柵設置・駐車場出入口カーブミラー取付工事
平面駐車場：2列×1区画 全収容台数：2台


・ピット埋戻・TT埋戻+アスファルト舗装（蜜粒）工事
・立駐前面浸透柵設置、新設カーブミラー設置工事

立駐機リニューアル：立駐機解体+ピット埋戻平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：地上4段式

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化駐車場

■before



■after



【既設機械式駐車装置】

地上4段式（8連：29台×1基） 計29台収容

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・ピット埋戻平面化駐車場改修工事

植栽部撤去+アスファルト舗装平面化駐車場改修工事

平面駐車場：8列×1区画 全収容台数：8台

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：地上4段式（8連：29台×1基） 計29台
- ・ピット埋戻+アスファルト舗装（蜜粒）工事、排水柵高上げ、縁石敷設工
- ・平面化駐車場改修工事：8台（区画ライン引き・車室No.・車止め設置）

（付帯工事）

- ・ターンテーブル撤去、埋戻+アスファルト舗装（開粒）
- ・既設門扉・フェンス撤去、新設門扉・フェンス設置
