

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：地下1段・地上3段縦列式

☆立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外・ピロティ有：2間口縦列）



■before



施工前

■after



施工後



解体後

【既設機械式駐車装置】

地下1段・地上3段縦列式（2連：12台×1基） 計12台収
 ターンテーブル（φ4000×1基）
 （屋外設置：ピロティ有り）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

ターンテーブル撤去+ピット埋戻・アスファルト舗装（開粒）
 鋼製平面化部材：フラットパーク（株豊国パーキングシステム製）
 鋼製平面化駐車場：2列縦列×1区画 計2台収容

【施工内容】

・機械式駐車装置解体撤去工事：地下1段・地上3段縦列式（2連：12×1基） 計12台収容
 ・鋼製平面化駐車場据付工事：2間口縦列×1区画 計2台収容
 ・ターンテーブル撤去+ピット埋戻アスファルト舗装工事

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット3段式

☆立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外：2間口）

■before



■after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段式（屋外設置：ピロティ有）
（2連：6台×1基） 全6台収容

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク（株豊国パーキングシステム製）
鋼製平面化駐車場：2列×1区画 計2台収容

【施工内容】

・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット3段式（2連：6台×1基） 全6台収容
・鋼製平面化駐車場据付工事：2間口×1区画 全2台収容
・付帯工事：ピット内高圧洗浄、既設コーナーアングル：ケレン+ローバル塗装

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット3段油圧式

☆立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外・ピロティ有り：3間口）




■before



施工前

■after

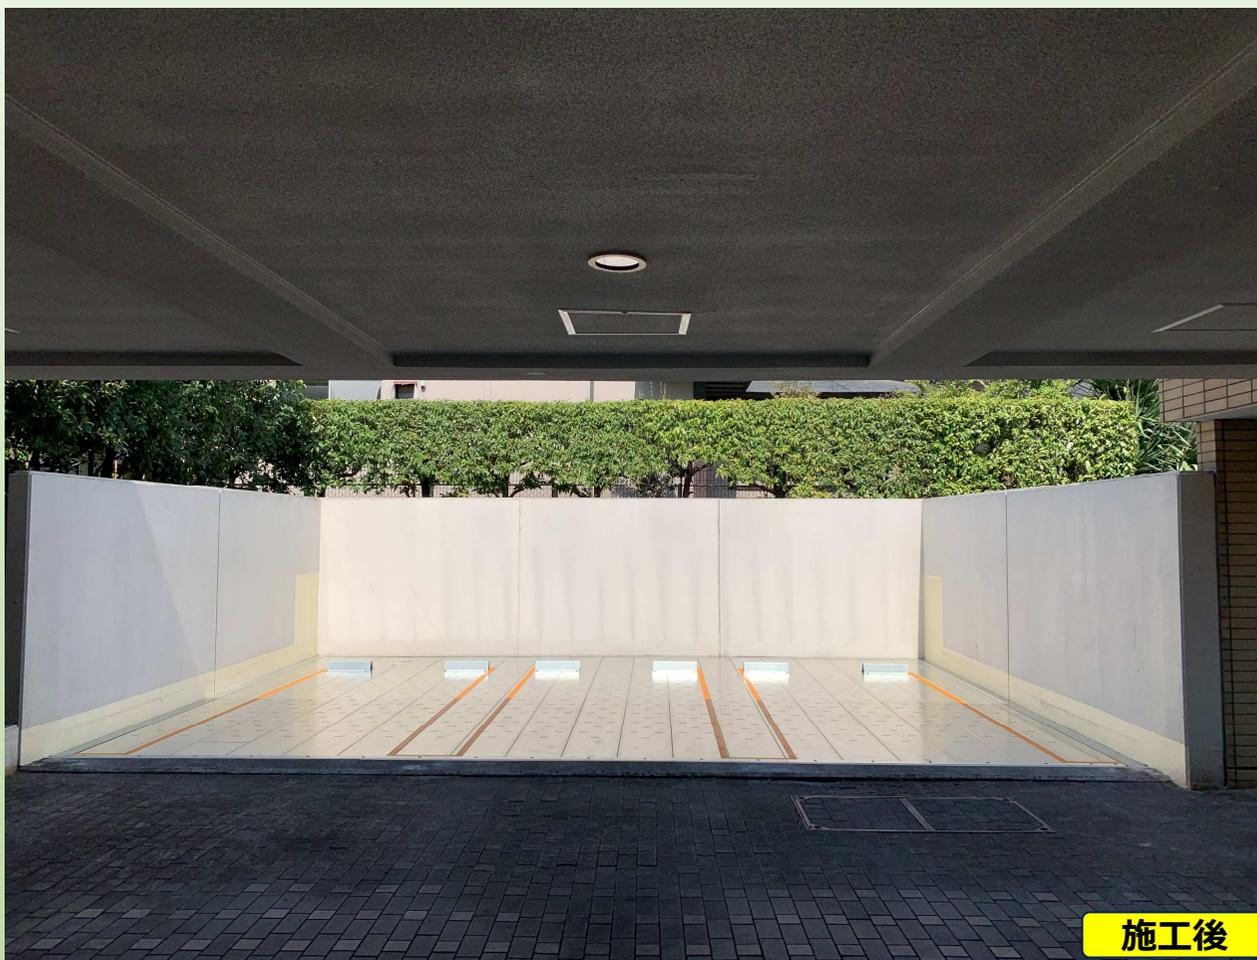

施工後



解体後

【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段油圧式（3連：9台×1基） 計9台収容
（屋外設置：ピロティ有り）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク（株）豊国パーキングシステム製
鋼製平面化駐車場：3列×1区画 計3台収容

【施工内容】・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット3段油圧式（3連：9台×1基） 計9台収容

・鋼製平面化駐車場据付工事：3間口×1区画 計3台収容

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）

☆ 既設立駐機：昇降ピット3段式


☆ 立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外：3間口）



■before



■after

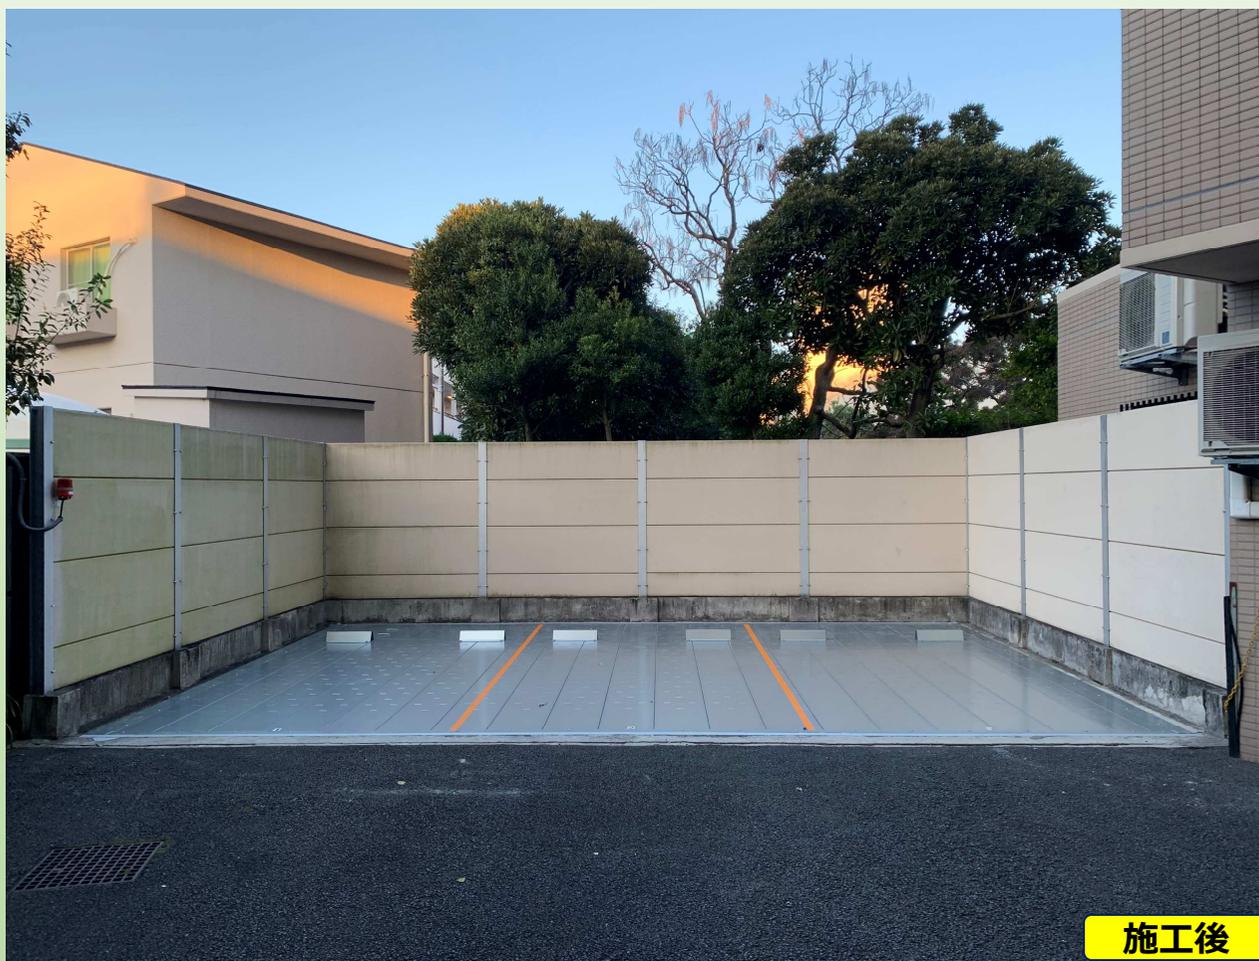

【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段式（3連：9台×1基） 計9台収（ピロティー有）

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット3段式（3連：9台×1基） 計9台収容
- ・鋼製平面化駐車場据付工事：3間口×1区画 計3台収容

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク（株豊国パーキングシステム製）
鋼製平面化駐車場：3列×1区画 計3台収容

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）


☆既設立駐機：昇降ピット3段油圧式

☆立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外：3間口）

■before



■after

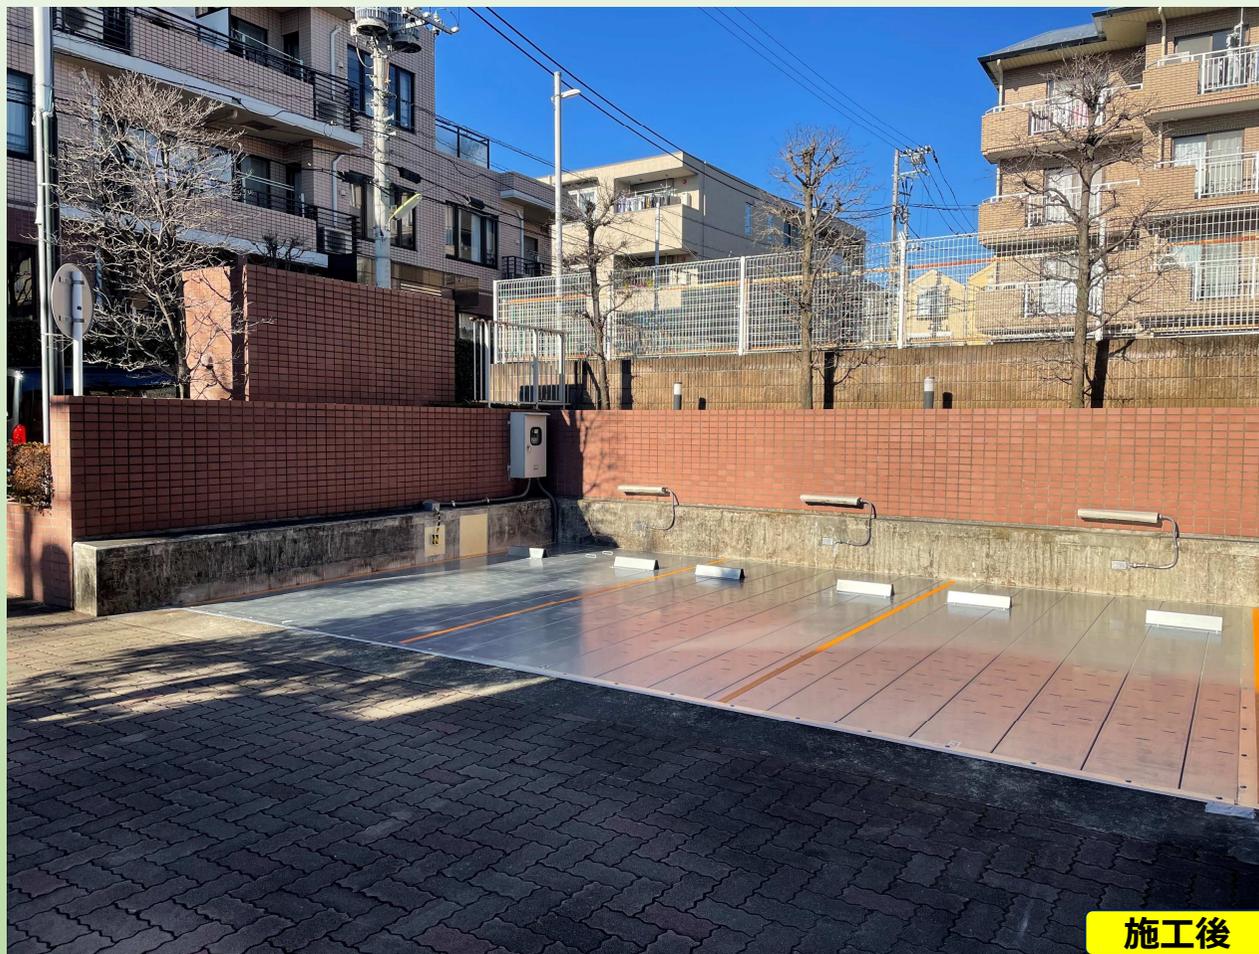

【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段油圧式
（3連：9台×1基） 計9台収容

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク（株豊国パーキングシステム製）
鋼製平面化駐車場：3列×1区画 計3台収容

【施工内容】
・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット3段油圧式（3連：9台×1基） 計9台収容
・鋼製平面化駐車場据付工事：3間口×1区画 計3台収容

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット3段油圧式

☆立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外・ピロティ有り：5間口）

■before



■after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段油圧式（5連：15台×1基） 計15台収容
（屋外設置：ピロティ有り）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク（株豊国パーキングシステム製）
鋼製平面化駐車場：5列×1区画 計5台収容

【施工内容】・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット3段油圧式（5連：15台×1基） 計15台収容


・鋼製平面化駐車場据付工事：5間口×1区画 計5台収容

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）


☆既設立駐機：昇降ピット3段油圧式

☆立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外・ピロティ有：5間口）

■before



■after

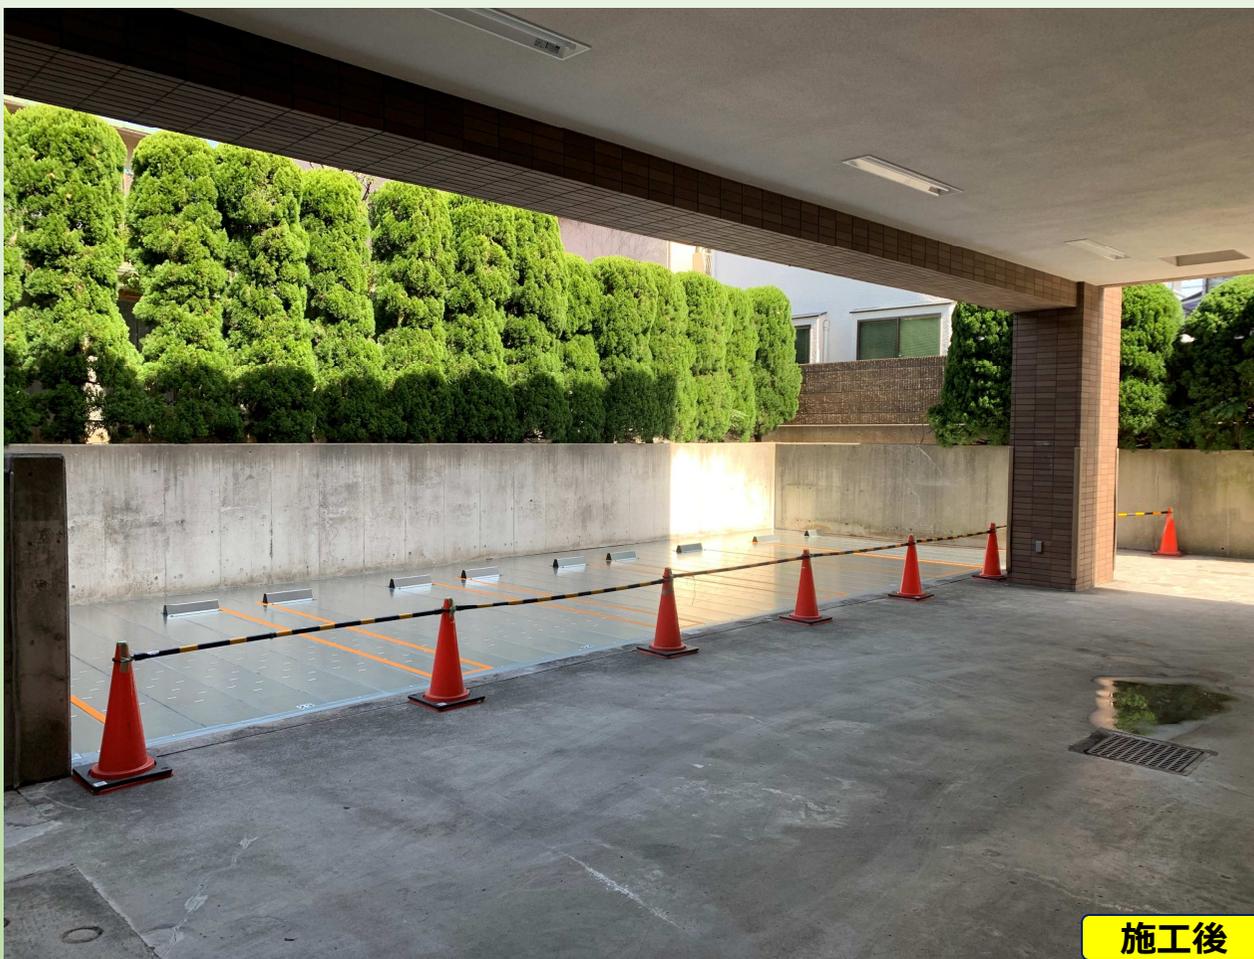

【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段油圧式（5連：15台×1基） 計15台収容
（屋外設置：ピロティ有り）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク（株豊国パーキングシステム製）
鋼製平面化駐車場：5列×1区画 計5台収容

【施工内容】・機械式駐車装置解体撤去工事：昇降ピット3段油圧式（5連：15台×1基） 計15台収容
・鋼製平面化駐車場据付工事：5間口×1区画 計5台収容

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット3段油圧式

☆立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外：5間口）

■before

■after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段油圧式（5連：15台×1基） 計15台収
（屋外設置）

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク（株）豊国パーキングシステム製
鋼製平面化駐車場：5列×1区画 計5台収容

【施工内容】・機械式駐車装置解体撤去工事

昇降ピット3段油圧式（5連：15×1基） 計15台収容

・鋼製平面化駐車場据付工事：5間口×1区画 計5台収容

【全体施工台数】

解体撤去：54台

鋼製平面化駐車場：18台

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事（before・after）

☆既設立駐機：昇降ピット3段油圧式

☆立駐解体+鋼製平面化駐車場（屋外：4間口）

■before



■after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段油圧式（4連：12台×1基） 計12台収容
（屋外設置）

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事
- 昇降ピット3段油圧式（4連：12×1基） 計12台収容
- ・鋼製平面化駐車場据付工事：4間口×1区画 計4台収容

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク（株）豊国パーキングシステム製
鋼製平面化駐車場：4列×1区画 計12台収容

【全体施工台数】

解体撤去：54台
鋼製平面化駐車場：18台

立駐機リニューアル：立駐機解体+鋼製平面化駐車場改修工事 (before・after)

☆ 既設立駐機：昇降ピット3段油圧式

☆ 立駐解体+鋼製平面化駐車場 (屋外：6間口)

■ before



■ after



【既設機械式駐車装置】

昇降ピット3段油圧式 (6連：18台×1基) 計18台収
(屋外設置)

【施工内容】・機械式駐車装置解体撤去工事

昇降ピット3段油圧式 (6連：18×1基) 計18台収容
・鋼製平面化駐車場据付工事：6間口×1区画 計6台収容

【改修内容】☆機械式駐車装置解体撤去・鋼製平面化駐車場改修工事

鋼製平面化部材：フラットパーク (株)豊国パーキングシステム製
鋼製平面化駐車場：6列×1区画 計6台収容

【全体施工台数】

解体撤去：54台
鋼製平面化駐車場：18台
